

1.3.- DIAGRAMA DE ACTIVIDAD.

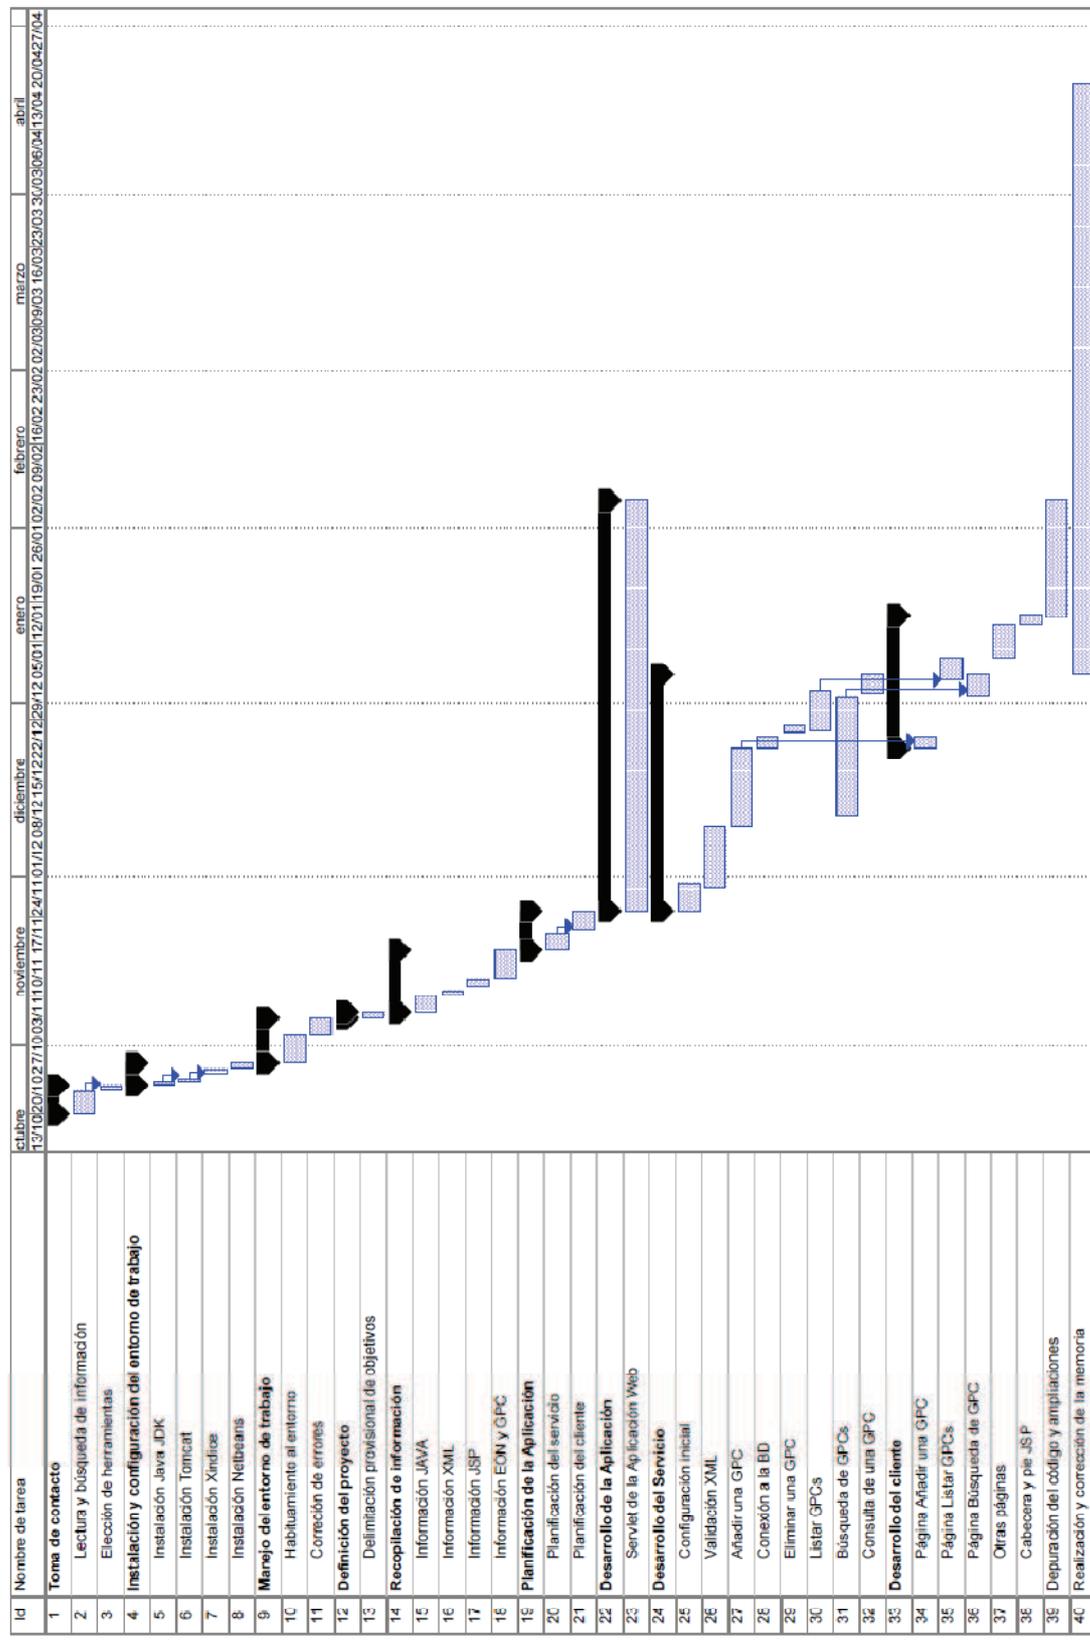


Ilustración 1.- Diagrama de Gantt.

En el diagrama de Gantt se puede observar una lista de las tareas realizadas y una estimación del tiempo empleado en cada una de ellas. Muchas de estas tareas no son independientes unas de otras, sino que la elaboración de una ha implicado la modificación de otra u otras.

Se debe tener en cuenta que la elaboración del proyecto se ha complementado con la experiencia profesional.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	Toma de contacto	5 días	lun 20/10/08	vie 24/10/08	
2	Lectura y búsqueda de información	4 días	lun 20/10/08	jue 23/10/08	
3	Elección de herramientas	1 día	vie 24/10/08	vie 24/10/08	2
4	Instalación y configuración del entorno de trabajo	3 días	sáb 25/10/08	mar 28/10/08	
5	Instalación Java JDK	0,5 días	sáb 25/10/08	sáb 25/10/08	
6	Instalación Tomcat	0,5 días	sáb 25/10/08	sáb 25/10/08	5
7	Instalación Xíndice	1 día	lun 27/10/08	lun 27/10/08	6
8	Instalación Netbeans	1 día	mar 28/10/08	mar 28/10/08	
9	Manejo del entorno de trabajo	6 días	mié 29/10/08	mié 05/11/08	
10	Habituaamiento al entorno	3 días	mié 29/10/08	dom 02/11/08	
11	Corrección de errores	3 días	lun 03/11/08	mié 05/11/08	
12	Definición del proyecto	1 día	jue 06/11/08	jue 06/11/08	
13	Delimitación provisional de objetivos	1 día	jue 06/11/08	jue 06/11/08	
14	Recopilación de información	7 días	vie 07/11/08	lun 17/11/08	
15	Intormación JAVA	1 día	vie 07/11/08	dom 09/11/08	
16	Información XML	1 día	lun 10/11/08	lun 10/11/08	
17	Información JSP	1,5 días	mar 11/11/08	mié 12/11/08	
18	Información EON y GPC	3 días	jue 13/11/08	lun 17/11/08	
19	Planificación de la Aplicación	5 días	mar 18/11/08	lun 24/11/08	
20	Planificación del servicio	3 días	mar 18/11/08	jue 20/11/08	
21	Planificación del cliente	1,5 días	vie 21/11/08	lun 24/11/08	20
22	Desarrollo de la Aplicación	55 días	mar 25/11/08	jue 05/02/09	
23	Servlet de la Aplicación Web	55 días	mar 25/11/08	jue 05/02/09	
24	Desarrollo del Servicio	32 días	mar 25/11/08	lun 05/01/09	
25	Configuración inicial	5 días	mar 25/11/08	sáb 29/11/08	
26	Validación XML	8 días	sáb 29/11/08	mar 09/12/08	
27	Añadir una GPC	10 días	mié 10/12/08	mar 23/12/08	
28	Conexión a la BD	2 días	mié 24/12/08	jue 25/12/08	
29	Eliminar una GPC	1,5 días	vie 26/12/08	sáb 27/12/08	
30	Listar GPCs	6 días	sáb 27/12/08	vie 02/01/09	
31	Búsqueda de GPCs	16 días	vie 12/12/08	jue 01/01/09	
32	Consulta de una GPC	1,5 días	vie 02/01/09	lun 05/01/09	
33	Desarrollo del cliente	18,5 días	mié 24/12/08	vie 16/01/09	
34	Página Añadir una GPC	2 días	mié 24/12/08	jue 25/12/08	27
35	Página Listar GPCs	4 días	lun 05/01/09	jue 08/01/09	30
36	Página Búsqueda de GPC	2 días	vie 02/01/09	lun 05/01/09	31
37	Otras páginas	4 días	vie 09/01/09	mié 14/01/09	
38	Cabecera y pie JSP	1,5 días	jue 15/01/09	vie 16/01/09	
39	Depuración del código y ampliaciones	15 días	vie 16/01/09	jue 05/02/09	
40	Realización y corrección de la memoria	75 días	mar 06/01/09	lun 20/04/09	

Ilustración 2.- Detalle del diagrama de actividad.
